


富山県厚生農業協同組合連合会 高岡病院改築工事 工事進捗状況 第Ⅰ期工事 12 月度

主な工事内容 **RI棟(手前)の最上階(4階)の躯体が完了し、内外装工事をおこなっています。** 撮影日 2011.1. 5



渡り廊下

【放射線棟・東診療棟渡り廊下工事中】  
 新放射線棟と東診療棟をつなぐ渡り廊下の工事を行っています。外壁として、押出成形板と呼ばれるコンクリートの板を取り付け、建具の取付が完了し、東診療棟とつなぐため、東診療棟廊下の壁を撤去しました。その後は内装工事が進んでいきます。  
 (写真左上)

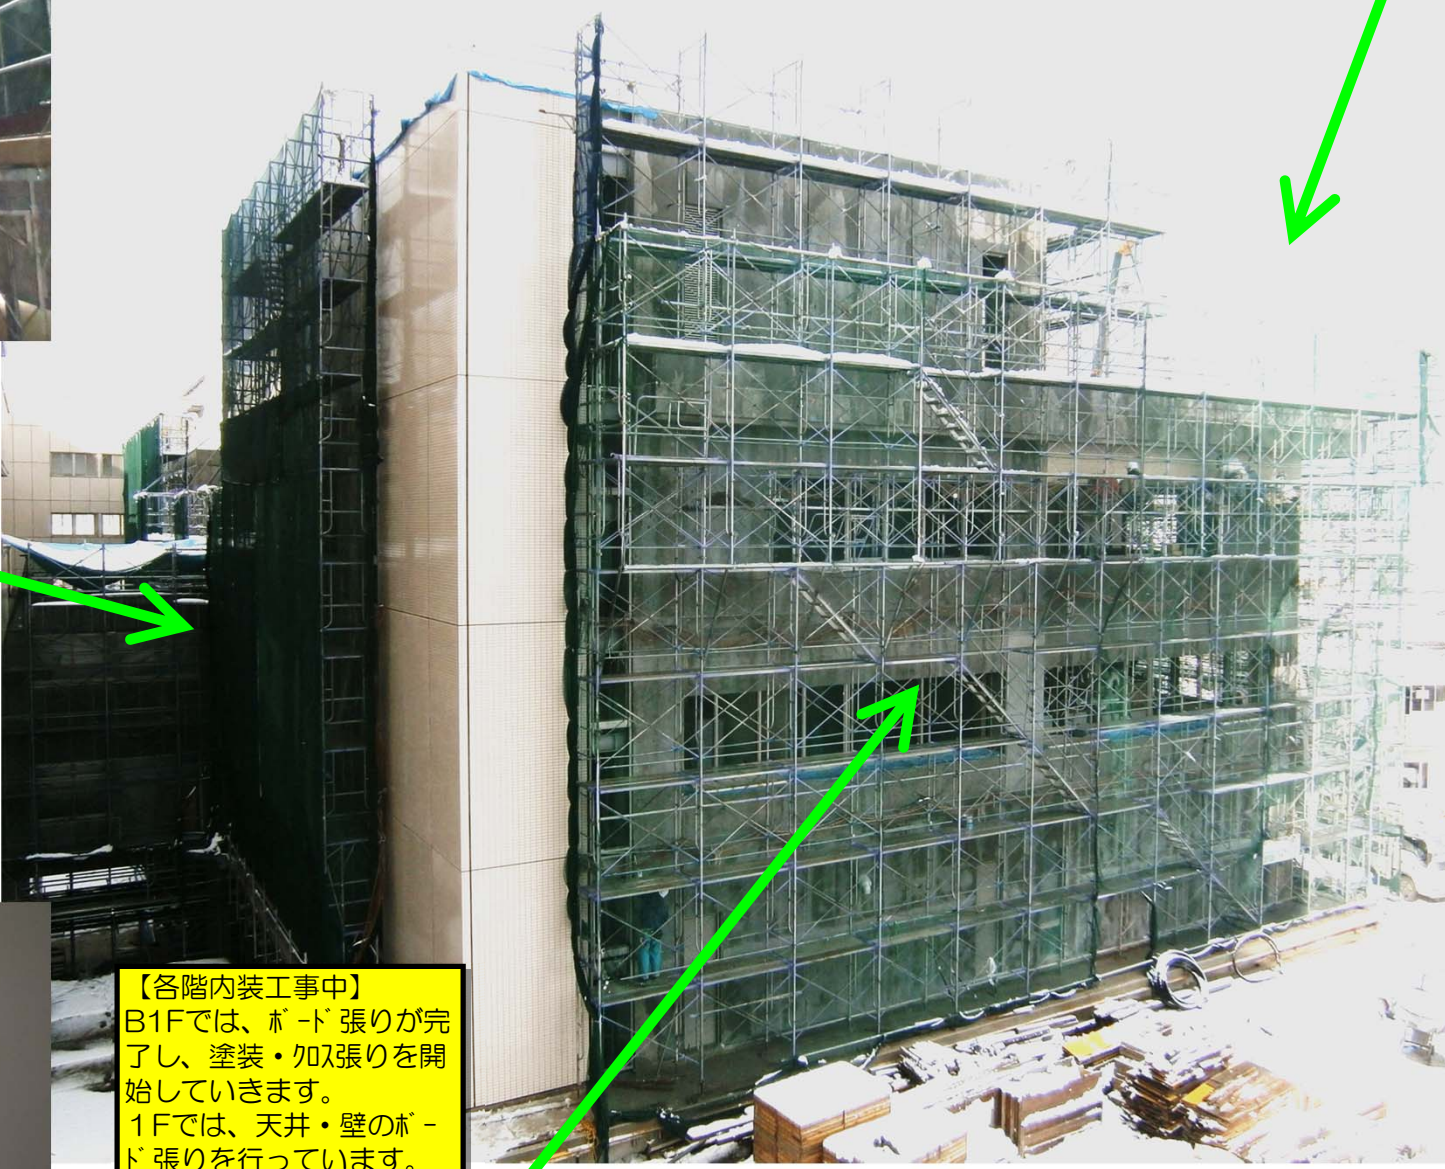

ライナック棟北面

【ライナック棟北面】  
 ライナック棟北面では、タイル張りが完了し、外部足場の解体を年明けに行いました。その後土間の整地を行い、仮設救命救急と繋がる鉄骨の建方を行っています。  
 (写真右上)

【仮設救命救急棟工事】  
 仮設救命救急では鉄骨の建方を行い、外装仕上げが完了しました。現在、内部で天井内の設備工事を行っており、順次仕上げ工事を行っています。  
 (写真左下)



B1F廊下

【各階内装工事中】  
 B1Fでは、ボード張りが完了し、塗装・加張りを開始していきます。  
 1Fでは、天井・壁のボード張りを行っています。  
 2Fでは天井下地組立を行っています。  
 3Fでは天井内の設備工事を行っています。  
 PHFでは型枠解体が完了し、仕上げ工事を行っています。  
 (写真左下)



仮設救急棟
