

# 富山県厚生農業協同組合連合会 高岡病院改築工事 工事進捗状況 第Ⅰ期工事 1 月度

主な工事内容

**内装・外装工事とも工事のピークです。また、スロープの工事が始まりました。**

撮影日


2012.1.31



屋上防水工事中



各階内装工事中

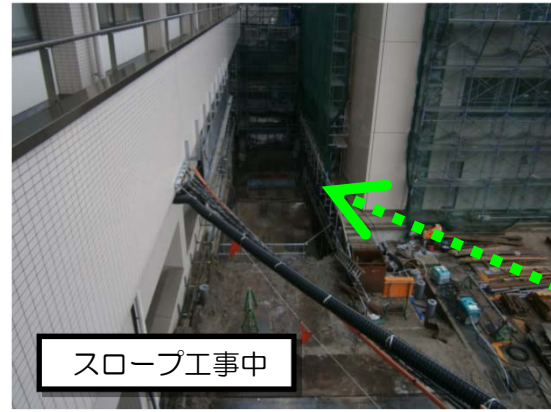

スロープ工事中




仮設救急棟工事中

**【屋上防水工事中】**  
 屋上では、雨水を防ぐため、防水工事を行っています。  
 屋上全面にアスファルトを染み込ませたシート状のものを220度前後に熱したアスファルトで張り付けていきます。

**【各階内装工事中】**  
 B1Fでは、塗装・クロス張りが完了し、床仕上げ工事を開始しています。  
 1F～3Fでは、天井・壁の塗装・クロス張りをしています。  
 4Fは電気室・機械室へ受変電設備・空調機の搬入が完了し、現在は接続工事をおこなっています。本設の電気を引き込むための工事が本格化しています。

**【スロープ工事中】**  
 地上から地下部分へとつながるスロープの工事が始まりました。  
 建物でおこなった流れと同様に、配筋工事、型枠工事、コンクリート打設といった順番でこれから工事が本格化します。

**【仮設救急棟工事中】**  
 放射線棟北面の外部足場が解体され、仮設救急棟Bの工事が本格化しています。1月26日に救命救急棟Bの床コンクリートを打設し、その後は内装・外装工事へと進んでいます。  
 また、以前から施工していた仮設救命救急棟Aは外装工事が完了し、外部足場を解体しまし

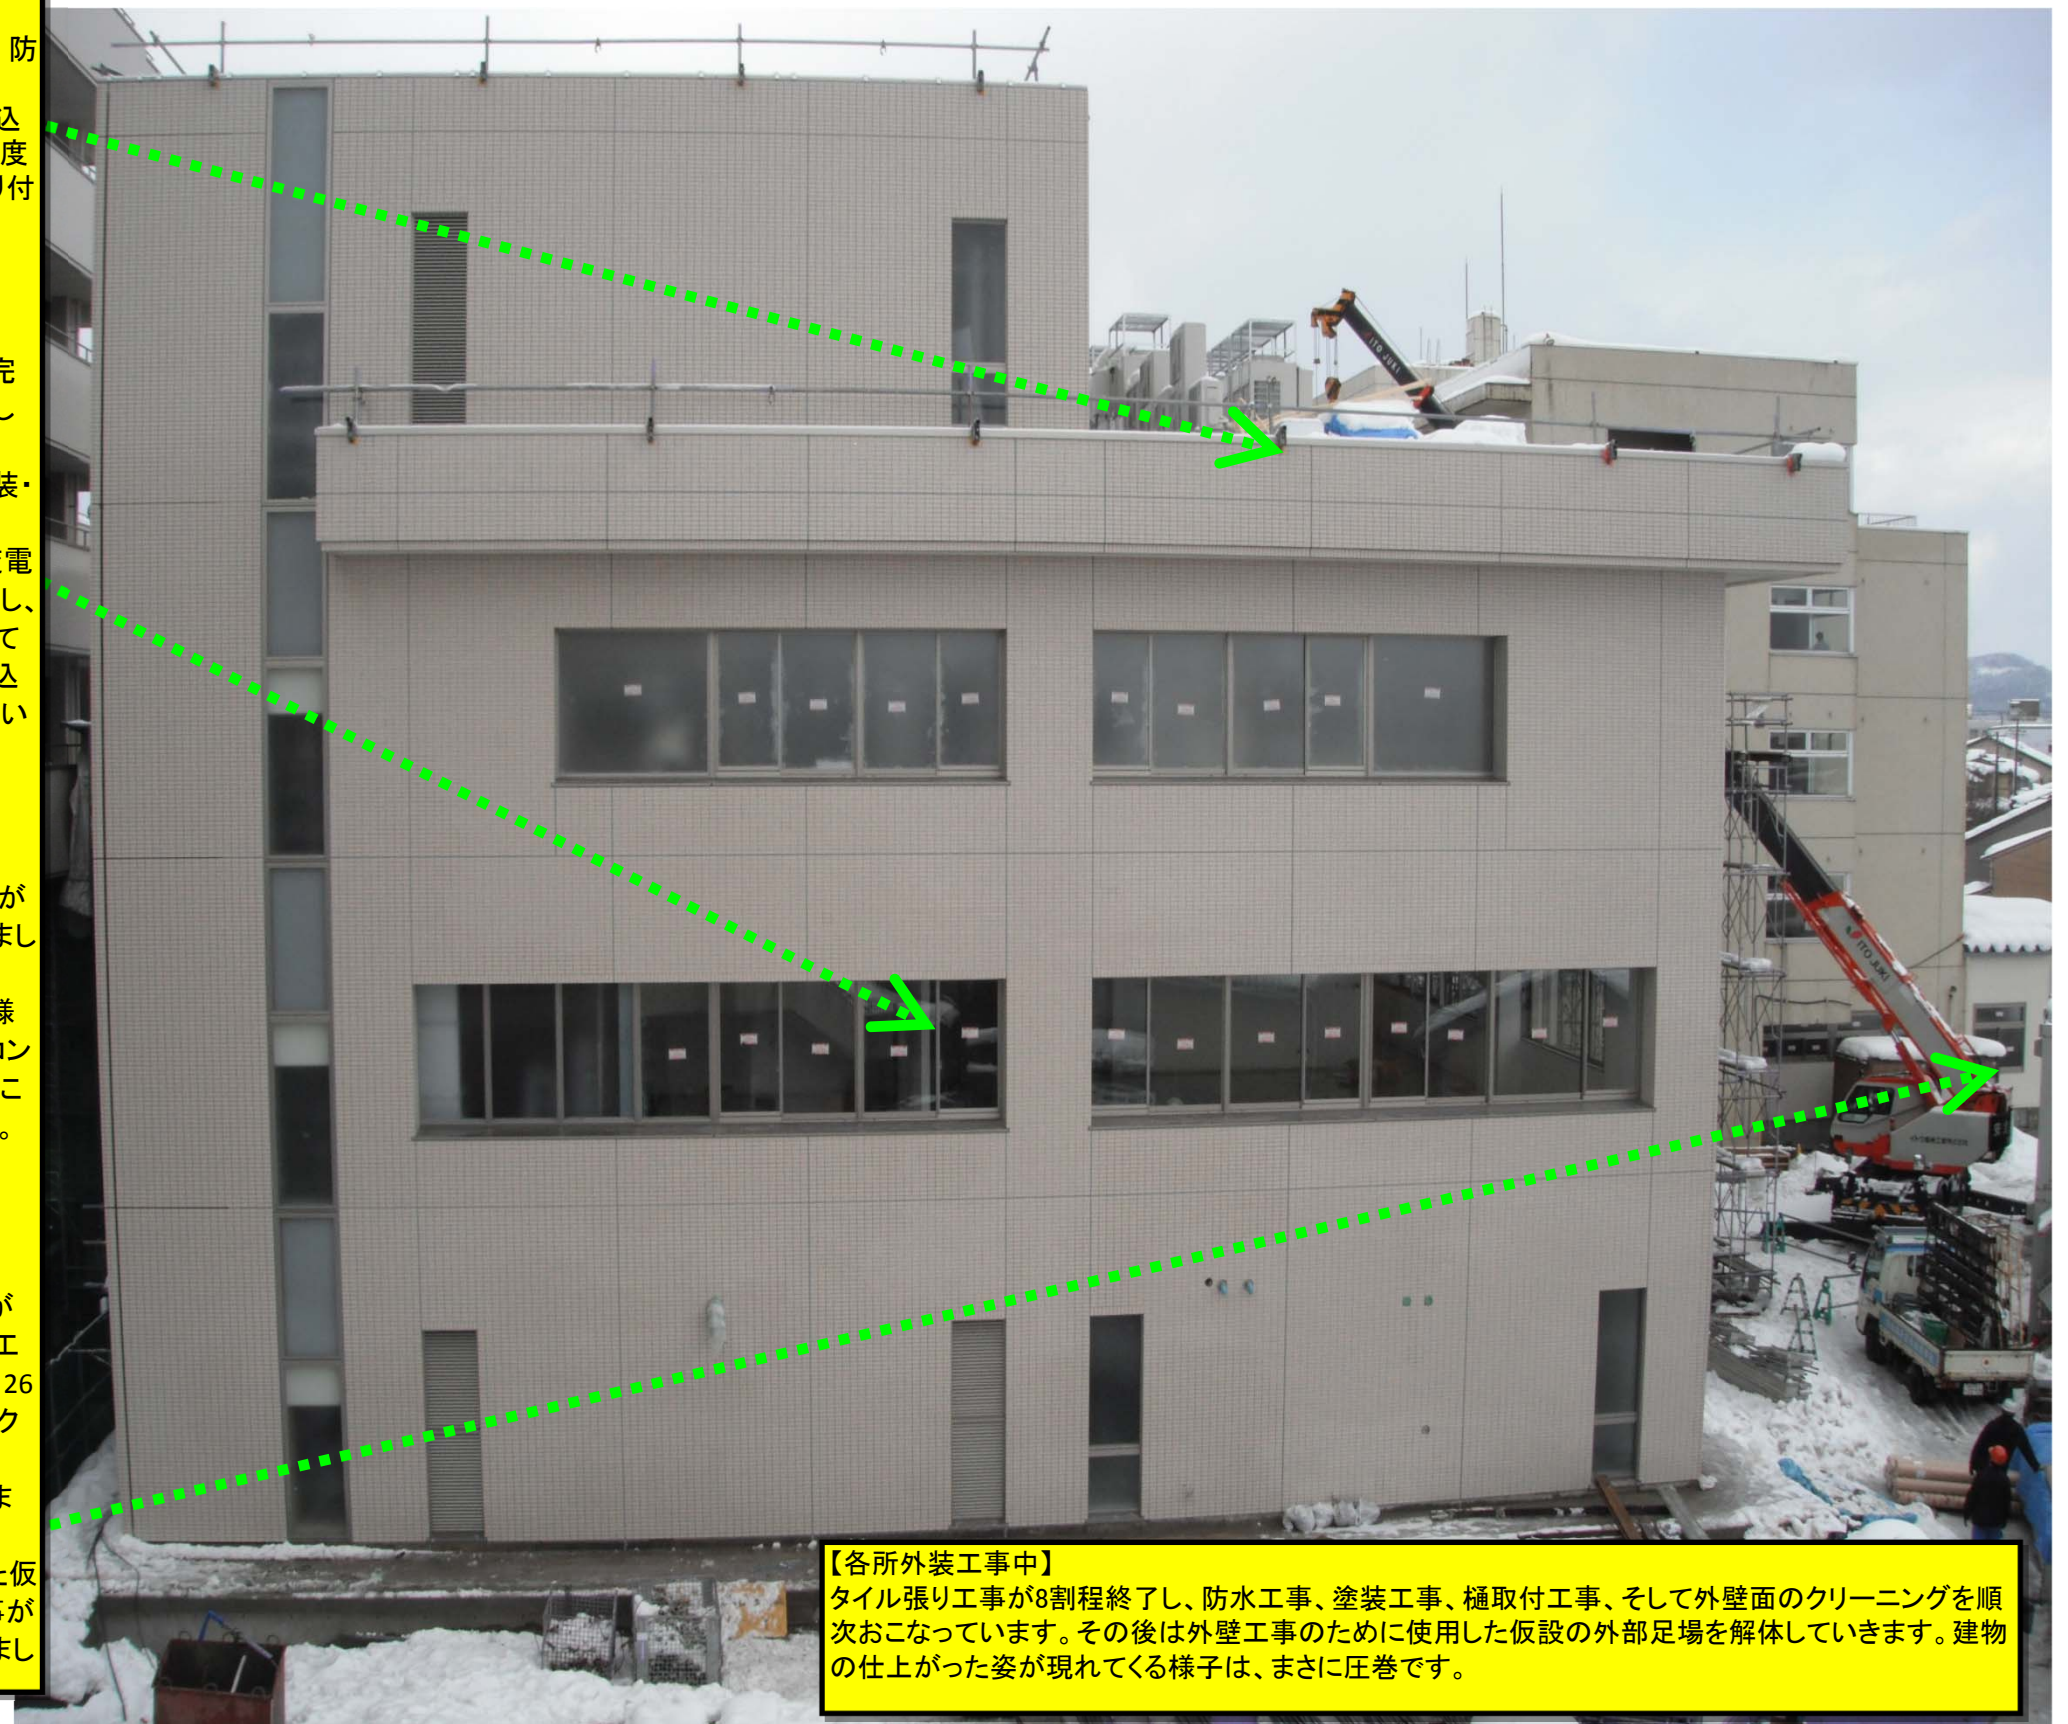

**【各所外装工事中】**  
 タイル張り工事が8割程終了し、防水工事、塗装工事、樋取付工事、そして外壁面のクリーニングを順次おこなっています。その後は外壁工事のために使用した仮設の外部足場を解体していきます。建物の仕上がった姿が現れてくる様子は、まさに圧巻です。
