

富山県厚生農業協同組合連合会 高岡病院改築工事 工事進捗状況 第Ⅱ期工事 12 月度

主な工事内容


B1Fでは床仕上げまで完了し、他の階では順次仕上工事へと工事が進んでいます。

撮影日

2012.12.29



南西面

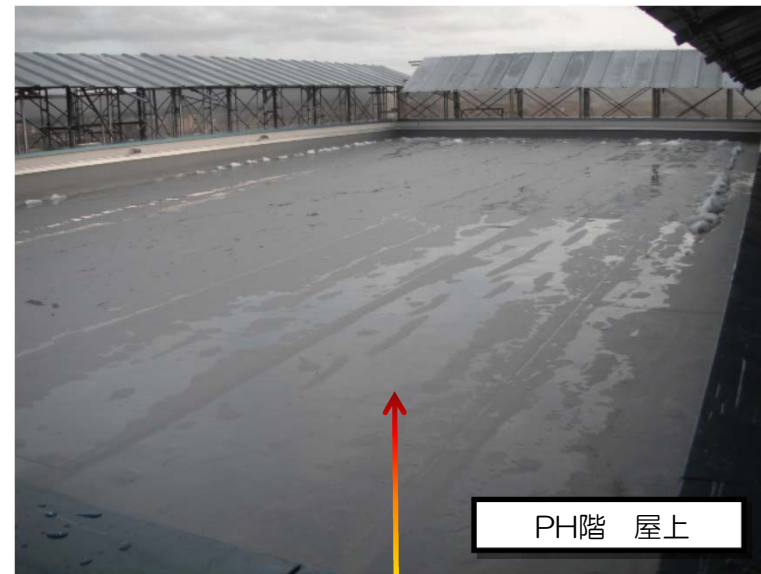

PH階 屋上

【PH階屋上防水工事完了】
PH階の屋上防水が完了しました。この後は、壁面の塗装やシーリング工事、笠木工事を行い、外部足場が解体されます。

【バルコニー軒天工事進行中】
バルコニー軒天工事が進んでいます。1階・5階はアルミ製パネル取付が完了しました。2・3・4階はケイカル板貼りおよび塗装仕上げ工事が進んでいます。

【B1階床仕上げ工事完了】
B1階では天井・壁・床の仕上工事が完了しました。この後は設備・電気器具を取り付け、工事完了となります。

【屋外階段工事完了】
屋外階段の手摺および、アルミルーバー取付の工事が完了しました。その後外部足場が解体され、屋外階段が姿を現しました。



4階 特浴室

【タイル下地モルタル塗付け中】
『特浴室』は完成すると壁面・床面ともタイル張りとなります。タイルを張るために壁面へモルタルを塗付け、下地を作っている段階です。



B1階 廊下
