


富山県厚生農業協同組合連合会 高岡病院改築工事 工事進捗状況 第Ⅲ期工事 11 月度

主な工事内容

A工区は、2階床が完成し、B工区は、12月2日に2階床が完成します。

2013.11.30

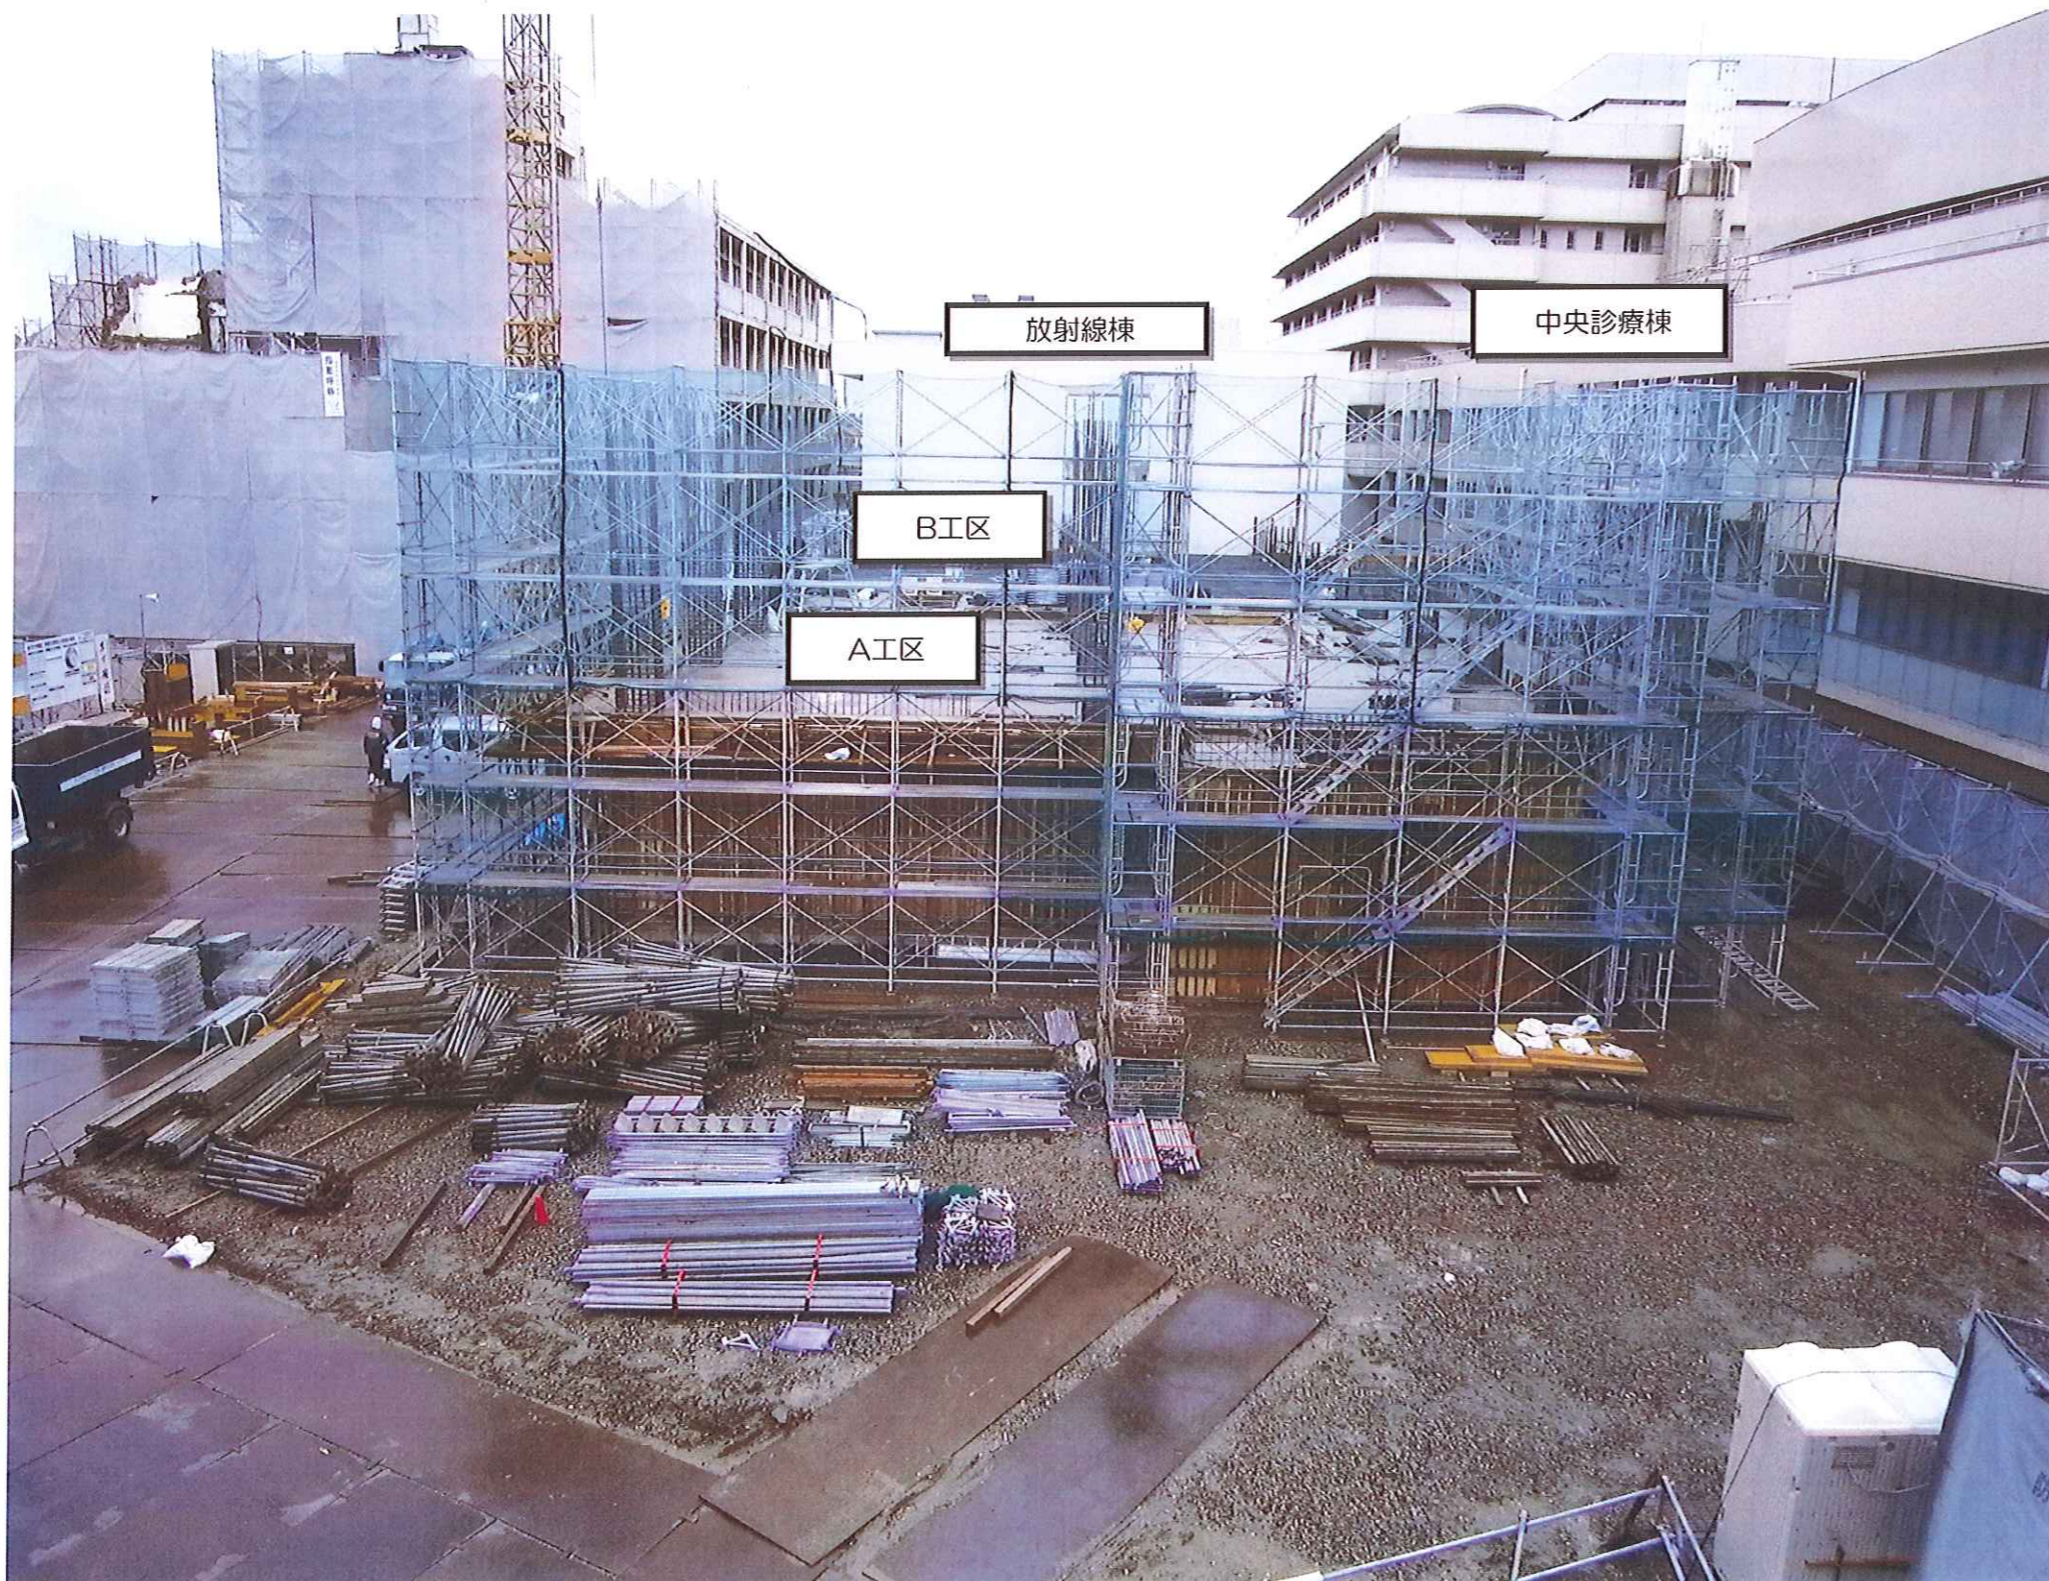

放射線棟

中央診療棟

B工区

A工区

北西面



コンクリート打設状況

【地上躯体工事】

1階立上り躯体工事からは、施工面積が大きくなるので、コンクリートを2回に分けて打設を行います。

1回の打設数量は約250㎡になり、朝7時～夕方17時まで打設を行います。コンクリートポンプ車は1台で打設を行い、約20人程の作業員でコンクリート打設を行います。夕方17時までコンクリートの打込みを行い、そこからコンクリートの硬化を待って左官工が仕上げを行います。今の時期は、気温が低いので仕上げが完了するのが深夜になる場合があります。

今後ますます気温が下がり、平均気温が4℃以下になる場合は、ジェットヒーター等で採暖養生を行い、コンクリートが硬化するのに適正な温度を保つようにします。

コンクリート打設が完了すると、次の階の立上り躯体工事を開始します。約20日後に次の階のコンクリート打設を行います。

年内にはA工区3階立上り躯体が完成する予定です。
