


富山県厚生農業協同組合連合会 高岡病院改築工事 工事進捗状況 第Ⅲ期工事 1 月度

主な工事内容

躯体工事は屋上床まで完成し、1階では内装工事を開始しました。

2014.1.31

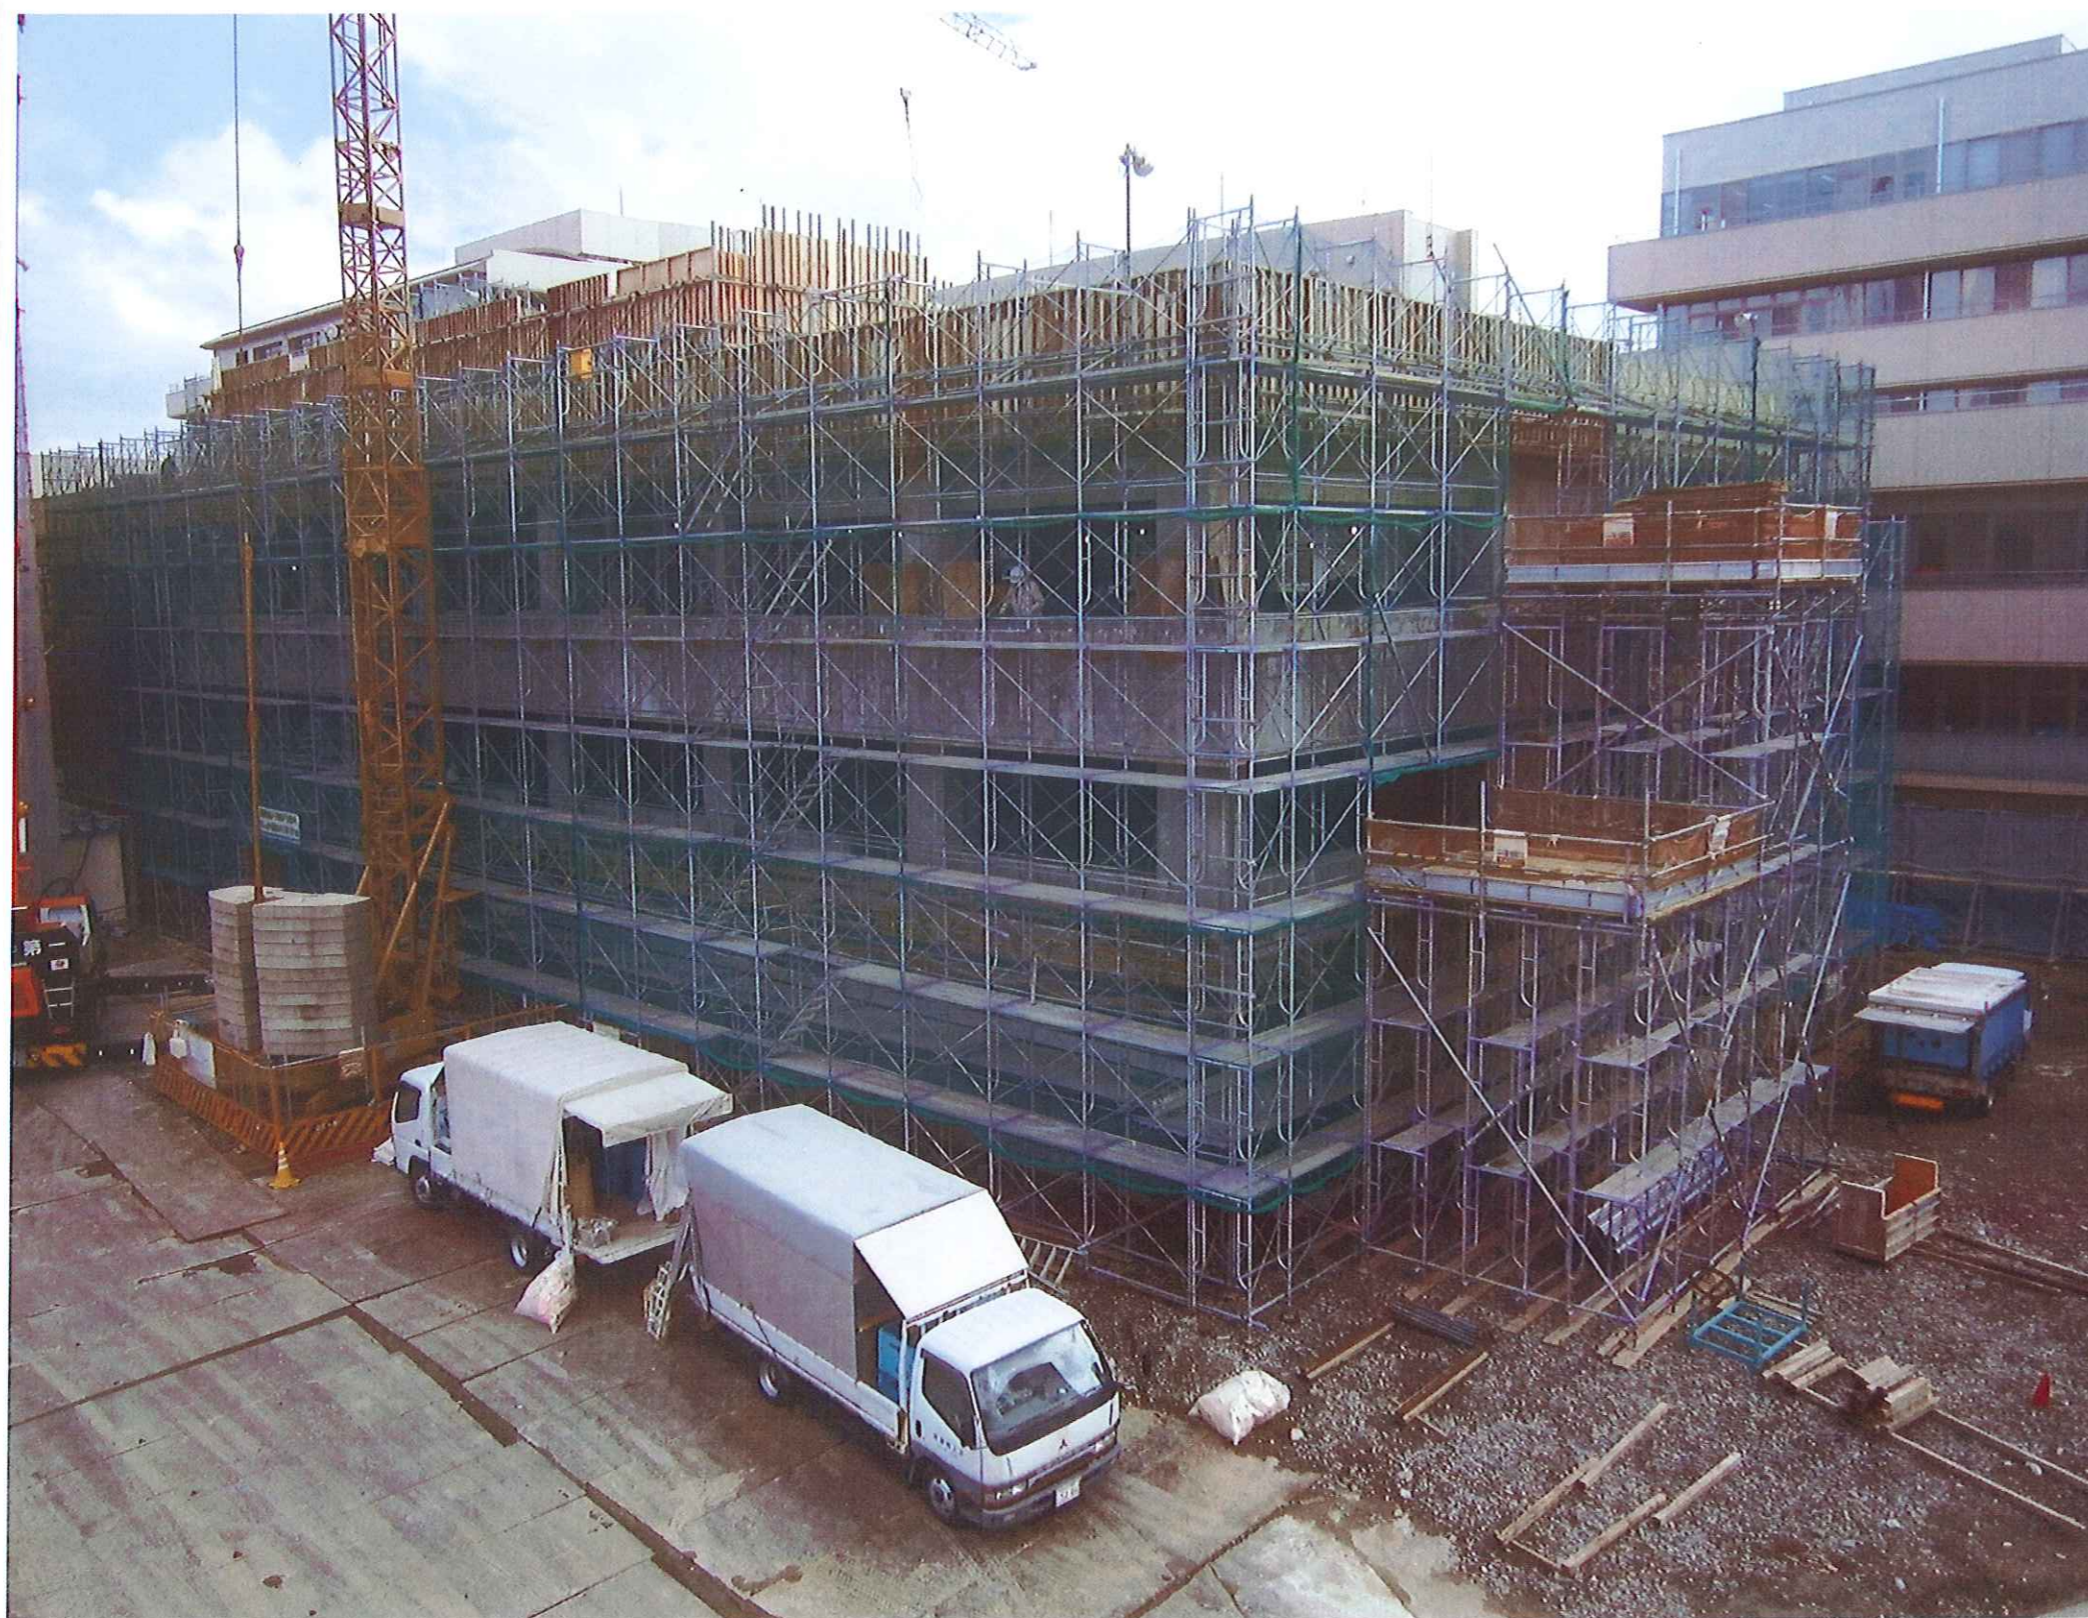

北西面



緊張ワイヤー



ワイヤー設置完了

【R2階梁ポストテンションPC】

一般部は柱が最大9m毎に配置されていますが、3階の講堂部は倍の18mで配置されています。その為、柱と柱を繋いでいる梁の曲げ強度を強くする為に、梁の中に高強度ワイヤーを通し、コンクリート打設を行い、強度発現後油圧ジャッキで緊張して、梁が撓む事を防止します。下の写真の銀色の筒の中に、上の写真のワイヤーが通っています。梁1本につき、6本のワイヤーを設置しています。
