



富山県厚生農業協同組合連合会 高岡病院改築工事 工事進捗状況 第Ⅲ期工事 2 月度


主な工事内容	外装ではタイル張り中です。内装ではクロス張りを開始しました。	2014.2.28
--------	--------------------------------	-----------

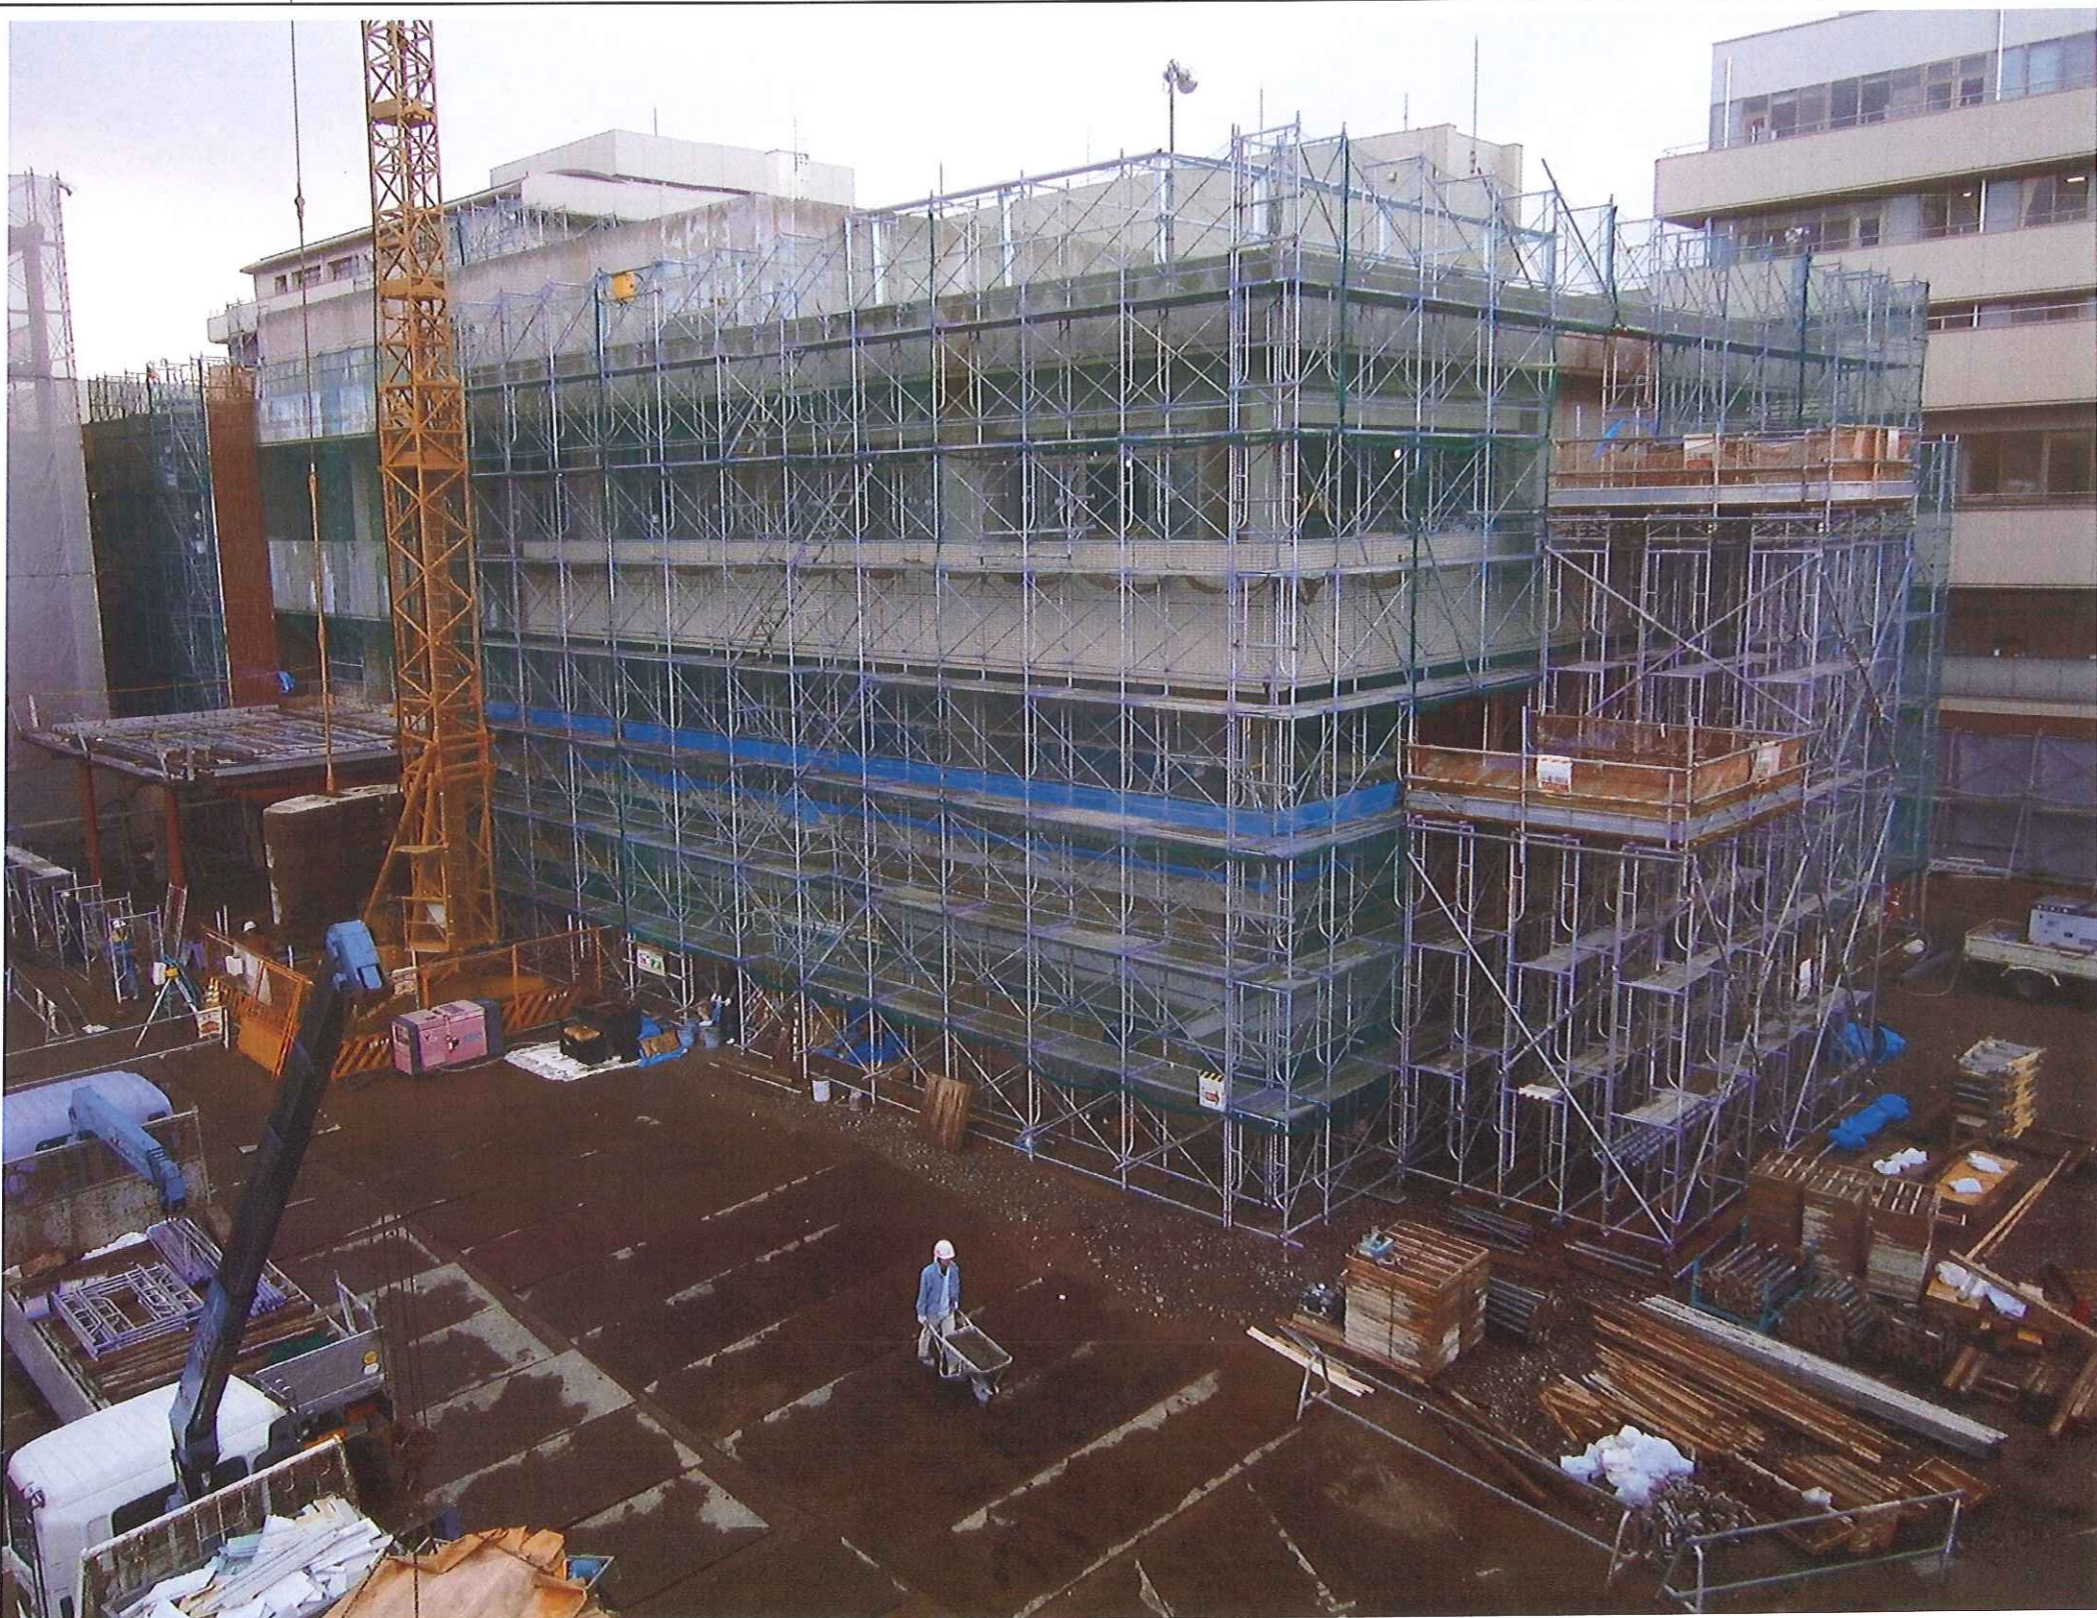

北西面

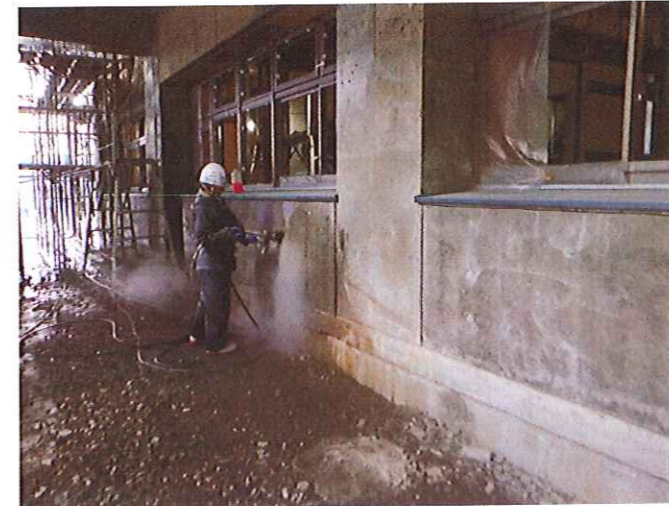

超高压洗浄

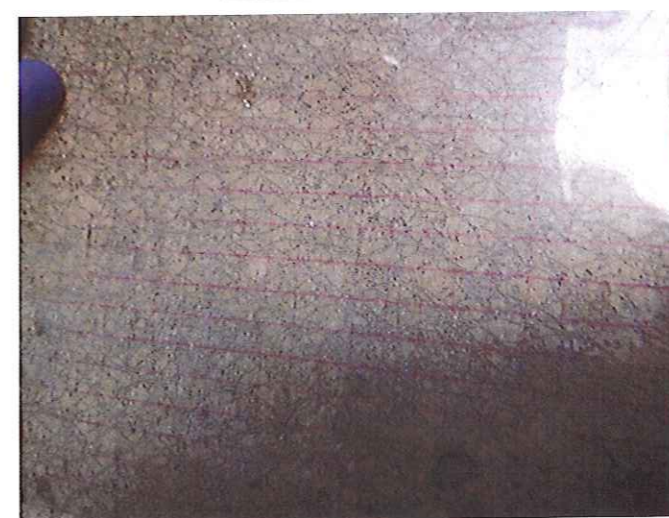

超高压洗浄完了

**【外壁タイル下地超高压洗浄】**  
 外装でタイルを張る所は、コンクリートの表面を超高压洗浄し、表面に細かい傷をつけます。水の圧力は150Mpaで、家庭用高压洗浄機の約15倍の圧力があります。  
 コンクリート表面を超高压洗浄する事で、タイル接着力が向上し、タイルが剥離しにくくなります。
